



**UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE PUEBLA**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA
INGENIERIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA**

ECOS DEL GRIMORIO

PRODUCTO 2: PRODUCCIÓN (SPRINT 2)

ASIGNATURA: CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS

MOTOR: UNITY 6

LENGUAJE: C#

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

PROCESO DE DESARROLLO: HUDDLE

PÉREZ ALCÁNTARA ALEJANDRO 10° "D"

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2026

ÍNDICE

Introducción.....	3
1. Fase de Producción en Huddle.....	3
1.1 Objetivo del Sprint 2.....	3
1.2 Sprint Plan replaneado.....	4
2. Feature Log y Sprint Backlog.....	4
2.1 Feature Log actualizado.....	4
2.2 Sprint Backlog del Sprint 2.....	5
2.3 Coherencia entre el Documento de Diseño y el backlog.....	7
3. Seguimiento del sprint.....	7
3.1 Daily Huddle.....	7
3.2 Project Chart.....	8
3.3 Burn-down Chart.....	9
3.4 Task Chart.....	10
4. Desarrollo del juego en Unity.....	10
4.1 Verbos principales del jugador.....	10
4.2 Arquitectura del código y Programación Orientada a Objetos.....	11
4.3 Escenas y niveles.....	12
4.4 Interfaces implementadas.....	17
4.5 Habilidades elementales y acertijos.....	18
4.6 Audio.....	18
4.7 Herramientas de editor.....	19
5. Pruebas Alfa.....	19
5.1 Casos de prueba.....	19
5.2 Buglist.....	20
6. Sprint Review.....	21
7. Presupuesto y licencia.....	21
7.1 Presupuesto.....	21
7.2 Licencia y propiedad intelectual.....	22
8. Plan para el Sprint 3.....	22
Conclusión.....	22
Referencias.....	23

Introducción

En este documento presento el segundo producto de la asignatura de Creación de Videojuegos, que corresponde a la fase de **Producción** del proceso Huddle para "Ecos del Grimorio". En el primer producto entregué la Preproducción: el Documento de Diseño, el Feature Log y el Sprint Plan iniciales, junto con el arte conceptual del juego. A partir de esa base, durante el Sprint 2 (del 19 de septiembre al 30 de octubre de 2026) llevé el diseño a Unity 6 y construí una versión jugable completa.

El documento reúne los artefactos que Huddle pide en esta fase: el Sprint Backlog, los registros del Daily Huddle, las gráficas de seguimiento (Project Chart, Burn-down Chart y Task Chart), las pruebas Alfa con su Buglist y la Sprint Review. También incluyo evidencias del juego funcionando en Unity, la arquitectura del código en C#, la relación entre el Documento de Diseño y las tareas del backlog, el presupuesto y la licencia del proyecto. Las tablas de producción completas, con sus fórmulas y gráficas, están en el libro de Excel **PérezAlcántaraAlejandro_producción_10D_Sprint2.xlsx** que acompaña a este documento.

1. Fase de Producción en Huddle

En Huddle, la Producción se organiza en sprints. Cada sprint arranca con un Sprint Huddle donde se eligen los features del Feature Log que se van a trabajar y se desglosan en tareas (Sprint Backlog). Durante el sprint, cada día de trabajo empieza con un Daily Huddle corto y el avance se revisa con las gráficas de seguimiento. Al terminar cada versión se hacen pruebas Alfa, los errores se registran en el Buglist y el sprint cierra con una Sprint Review. Como el proyecto es individual, yo cubro todos los roles (Game Designer, Project Manager, programador y tester), por lo que las reuniones se registran por escrito al iniciar cada sesión.

1.1 Objetivo del Sprint 2

El Sprint Plan inicial asignaba al Sprint 2 el Ala de Fuego y el Ala de Hielo con sus jefes. Al empezar a programar decidí construir primero una base reutilizable (datos en ScriptableObjects, herencia de enemigos y una herramienta de editor que arma las escenas), y con esa base fue posible avanzar más rápido de lo planeado. Por eso el objetivo del sprint se amplió a:

- Tener el juego completo y jugable de principio a fin: menú, prólogo, las cinco alas de la Torre, los cuatro guardianes, el jefe final, epílogo y créditos.
- Implementar los sistemas del Documento de Diseño que no estaban en el Feature Log inicial: Opciones, HUD, resultados por nivel, audio, control, armas e ítems.
- Hacer pruebas Alfa con teclado y con control de PS4, y corregir los errores encontrados.

1.2 Sprint Plan replaneado

Al adelantar los features 9 a 13 (Ala de Viento, Corazón del Grimorio, Logros y Modo Archimaga), los Sprints 3 y 4 quedan dedicados a pruebas Beta, balance, corrección de errores, Gold Master y Postmortem.

Tabla 1. Sprint Plan replaneado durante el Sprint 2.

Sprint	Inicio	Días	Fin	Estado	Meta	Entrega
1	01/09/2026	18	18/09/2026	Terminado	Preproducción y arte: GDD, bocetos, arte conceptual de personajes, enemigos, fondos, ítems y UI.	Producto 1 (18 sep)
2	19/09/2026	42	30/10/2026	En desarrollo	Juego completo jugable en Unity: 5 alas, 4 guardianes y jefe final, logros, Modo Archimaga, opciones, resultados, música y voces. Pruebas Alfa.	Producto 2 (30 oct)
3	31/10/2026	21	20/11/2026	Planeado	Pruebas Beta (cerradas y abiertas), balance de dificultad, corrección de bugs y borrador del Postmortem.	Producto 3 (20 nov)
4	21/11/2026	10	30/11/2026	Planeado	Gold Master: build final, Postmortem completo y entrega.	Gold Master (30 nov)

2. Feature Log y Sprint Backlog

2.1 Feature Log actualizado

El Feature Log inicial tenía 14 features. Durante el sprint agregué 12 más (del 15 al 26) para que cada sección del Documento de Diseño tuviera un feature que la respaldara, por ejemplo la pantalla de Opciones, el audio o el control.

Tabla 2. Feature Log actualizado al Sprint 2.

ID	Feature	Estado	Sprint	Comentarios
1	Movimiento y salto del jugador	Terminado	2	PlayerController.cs: aceleración, coyote time, búfer de salto, esquivar, agacharse y planeo
2	Sistema de maná y hechizo Arcano	Terminado	2	SpellCaster.cs + SpellData.cs; tres espacios de hechizo
3	IA de patrulla/persecución básica	Terminado	2	EnemyBase.cs → EnemyAI, FlyingEnemyAI, RangedEnemyAI
4	Sistema de vida (jugador/enemigos)	Terminado	2	Health.cs + IDamageable, resistencias por elemento
5	Hechizo de Fuego y combo Explosión Arcana	Terminado	2	Se adelantó al Sprint 2
6	Ala de Fuego completa con jefe Kaelor (Nivel 2)	Terminado	2	KaelorBoss.cs, 2 fases
7	Hechizo de Hielo y combo Vapor Cegador	Terminado	2	Congela al tercer golpe (2.11)
8	Ala de Hielo completa con jefa Isolde (Nivel 3)	Terminado	2	IsoldeBoss.cs, congela el suelo

ID	Feature	Estado	Sprint	Comentarios
9	Hechizo de Viento y combos Granizo Cortante / Tormenta de Ascuas	Terminado	2	Planeado para Sprint 3, se adelantó
10	Ala de Viento completa con jefe Threnody y plataformas móviles (Nivel 4)	Terminado	2	Planeado para Sprint 3, se adelantó
11	Corazón del Grimorio: Ecos Menores, Guardián Espejo y jefe final multifase (Nivel 5)	Terminado	2	ElenoraBoss.cs, 4 fases + final. Final del juego corregido el 7 de octubre
12	Sistema de Logros (AchievementManager basado en eventos)	Terminado	2	10 logros, se adelantó del Sprint 4
13	Sistema de truco / Easter egg (Modo Archimaga)	Terminado	2	Teclado F-H-V-A + Enter; control L1 + R1 + Triángulo
14	Integración final, pulido y Gold Master	En desarrollo	3-4	Pruebas Alfa en curso; Beta y Gold Master en Sprints 3 y 4
15	Menú principal, pausa, Game Over y guardado (2.4, 2.5, 2.6)	Terminado	2	Agregado en Sprint 2 desde el GDD
16	Pantalla de Opciones (2.5, 2.6)	Terminado	2	Volumen de música, efectos y voces, pantalla completa y vibración
17	HUD y pantalla de resultados por ala (2.6)	Terminado	2	Tiempo, enemigos, daño, páginas, secretos
18	Historia: prólogo, diálogos, epílogo y créditos (2.14)	Terminado	2	Prologo.cs, NPCDialogue.cs, CreditsScreen.cs
19	Música, efectos de sonido y voces (2.17)	Terminado	2	9 pistas, 29 efectos y voces por personaje
20	Control de PS4 / Xbox y vibración (2.4)	Terminado	2	New Input System
21	Habilidades elementales y acertijos ambientales (2.1, 2.3, 2.11)	Terminado	2	Zarzas, muros de hielo, cajas, placas y puertas rúnicas
22	Armas de los enemigos (2.12)	Terminado	2	ArmaEnemigo.cs: Garras, Lanza, Embestida
23	Ítems, coleccionables y salas secretas (2.8, 2.13)	Terminado	2	Páginas Perdidas, vasijas, cofres y fragmentos
24	Build del juego para Windows (.exe) (5.1)	En desarrollo	2-3	Menú Ecos del Grimorio > Compilar juego (.exe)
25	Documentación del Producto 2 (producción y evidencias)	En desarrollo	2	Documento Word/PDF y este libro de Excel
26	Pruebas Beta y reporte Postmortem	Planeado	3-4	Jugadores externos; plantilla de Postmortem de Huddle

2.2 Sprint Backlog del Sprint 2

Desglosé los features en 35 tareas con su esfuerzo estimado en horas. La columna Fin indica el día en que cada tarea quedó terminada y es la que alimenta el Burn-down Chart y el Task Chart.

Tabla 3. Sprint Backlog del Sprint 2 (miembro: Alejandro Pérez Alcántara, rol: Programador).

Tarea	Feature	Nombre de la tarea	Estado	Horas	Fin
T01	15	Ordenar sprites e importarlos a Unity (ConfigureSprites.cs)	Terminado	6	30/09/2026
T02	2	ScriptableObjects SpellData, ItemData y EnemyData	Terminado	4	30/09/2026
T03	1	PlayerController: movimiento, salto, coyote time, búfer y esquivar	Terminado	8	30/09/2026

Tarea	Feature	Nombre de la tarea	Estado	Horas	Fin
T04	4	Health.cs, interfaz IDamageable y resistencias por elemento	Terminado	3	30/09/2026
T05	2	SpellCaster: tres hechizos equipados, maná y tiempo de recarga	Terminado	6	30/09/2026
T06	3	EnemyBase y herencia de IA (EnemyAI, FlyingEnemyAI, RangedEnemyAI)	Terminado	6	30/09/2026
T07	15	GameManager con los estados del juego (2.5) y guardado	Terminado	5	30/09/2026
T08	14	Herramienta de editor que arma escenas y prefabs (CrearJuego.cs)	Terminado	10	04/10/2026
T09	6	Ala de Fuego con Centinelas, Salamandras y Kaelor	Terminado	6	04/10/2026
T10	8	Ala de Hielo con Espectros Escarchados, Cristales e Isolde	Terminado	6	04/10/2026
T11	10	Ala de Viento con Aves, Golems, plataformas móviles y Threnody	Terminado	6	04/10/2026
T12	11	Corazón del Grimorio y Eco de Elenora (4 fases + final)	Terminado	8	04/10/2026
T13	12	AchievementManager con los 10 logros	Terminado	3	04/10/2026
T14	15	Menú principal, pausa y Game Over con UGUI	Terminado	5	04/10/2026
T15	18	Prólogo, diálogos de personajes y textos de la historia	Terminado	5	04/10/2026
T16	20	Control de PS4 / Xbox con New Input System y vibración	Terminado	4	04/10/2026
T17	19	Música (9 pistas) y efectos de sonido	Terminado	6	05/10/2026
T18	19	Voces de los personajes y quejidos de Lira	Terminado	4	05/10/2026
T19	1	Agacharse, animación de piernas, sombra y pasos	Terminado	4	05/10/2026
T20	23	Niveles más grandes: salas secretas, Páginas Perdidas, vasijas y cofres	Terminado	6	05/10/2026
T21	13	Modo Archimaga con teclado y control	Terminado	2	05/10/2026
T22	11	Coloso de Raíz, Gárgola de Runa y espíritus de los guardianes	Terminado	5	05/10/2026
T23	9	Apuntar en cualquier dirección y combo rápido	Terminado	4	05/10/2026
T24	22	Armas de los enemigos (ArmaEnemigo.cs)	Terminado	3	05/10/2026
T25	16	Pantalla de Opciones (OpcionesUI.cs)	Terminado	4	05/10/2026
T26	17	Pantalla de resultados al terminar cada ala	Terminado	3	05/10/2026
T27	21	Habilidades 2.11 y acertijos: zarzas, hielo, cajas, placas y puertas	Terminado	6	05/10/2026
T28	18	Epílogo y créditos	Terminado	3	05/10/2026
T29	11	Corregir el final del juego al derrotar a Elenora (B-012)	Terminado	2	07/10/2026
T30	24	Capturas con F12 y compilación del .exe desde el menú	Terminado	3	07/10/2026
T31	25	Actualizar el libro de producción con el Sprint 2	Terminado	3	07/10/2026
T32	14	Pruebas Alfa de las cinco alas (ver hoja Pruebas Alfa)	En desarrollo	6	
T33	24	Generar el .exe y probarlo en otra computadora	Planeado	2	
T34	25	Documento del Producto 2 en Word y PDF con capturas	En desarrollo	6	
T35	14	Sprint Review del Sprint 2	Planeado	1	

Al 7 de octubre llevo **31 de 35** tareas terminadas, que equivalen a **91%** de las 164 horas estimadas del sprint. Las tareas pendientes son las pruebas Alfa completas, el ejecutable probado en otra computadora, este documento y la Sprint Review.

2.3 Coherencia entre el Documento de Diseño y el backlog

Para comprobar que lo que se programa corresponde a lo que se diseñó, relacioné cada requisito del Documento de Diseño con su feature y con las tareas que lo implementan.

Tabla 4. Matriz de coherencia entre el Documento de Diseño y el Sprint Backlog.

Sección	Requisito del Documento de Diseño	Feature	Tareas	Estado
2.1 / 2.3	Acertijos ambientales; cada hechizo abre rutas bloqueadas	21	T27	Terminado
2.4	Cámara lateral con seguimiento suave	1	T03	Terminado
2.4	Teclado y control (New Input System)	20	T16	Terminado
2.4	Guardado automático en puntos de control	15	T07	Terminado
2.5	Estados: Menú, Juego, Pausa, Logros, Game Over, Créditos	15	T07, T14	Terminado
2.5 / 2.6	Pantalla de Opciones	16	T25	Terminado
2.6	HUD: vida, maná, hechizo equipado y fragmentos	17	T14, T26	Terminado
2.7	Cinco niveles (alas) con su elenco y guardián	6, 8, 10, 11	T09 a T12	Terminado
2.8	Progreso: hechizos, fragmentos y coleccionables	23	T20	Terminado
2.9 / 2.10	Personajes y enemigos	3, 11	T06, T22	Terminado
2.11	Habilidades: Fuego quema, Hielo congela, Viento planea y empuja	5, 7, 9, 21	T23, T27	Terminado
2.12	Armas de los enemigos	22	T24	Terminado
2.13	Ítems y mejoras	23	T02, T20	Terminado
2.14	Guion: prólogo, diálogos y epílogo	18	T15, T28	Terminado
2.15	Diez logros	12	T13	Terminado
2.16	Código secreto (Modo Archimaga)	13	T21	Terminado
2.17	Música, efectos y sonido especial al vencer a un jefe	19	T17, T18	Terminado
4.3	Pruebas Alfa y Beta	14, 26	T32 (Beta en Sprint 3)	En desarrollo
5.1	Generación del ejecutable para Windows	24	T30, T33	En desarrollo

3. Seguimiento del sprint

3.1 Daily Huddle

Cada sesión de trabajo empezó respondiendo las tres preguntas del Daily Huddle. Estos son los registros del sprint:

Tabla 5. Registro del Daily Huddle del Sprint 2.

Fecha	¿Qué hice desde el último Huddle?	¿Qué haré hoy?	Impedimentos
19/09/2026	Sprint Huddle de arranque: cierre del Sprint 1 y revisión del Feature Log.	Ordenar el arte y empezar a importarlo a Unity.	Primera vez armando un proyecto completo en Unity 6.
30/09/2026	Sprites ordenados; 15 enemigos y jefes y 12 ítems importados.	Código base: ScriptableObjects, PlayerController, Health, SpellCaster, EnemyBase y GameManager.	Muchos sprites con nombres distintos al GDD; se renombraron.
04/10/2026	Código base y Nivel 1 armado con herramienta de editor.	Generar el juego completo (5 alas, jefes, logros, créditos) y probarlo en Unity.	El escenario se veía plano y las barras del HUD no cargaban su imagen (B-001).
05/10/2026	Versión 2 con control de PS4, luces 2D y nueva interfaz; historia dentro del juego.	Música, voces, agacharse, niveles más grandes, Opciones, resultados, habilidades 2.11 y acertijos.	Sin sonido (B-003), textos fuera del marco (B-004), final repetido (B-006), portal del Nivel 1 atorado (B-011).
07/10/2026	Opciones, resultados, habilidades y nueva fuente subidos al repositorio.	Corregir el final de Elenora, agregar capturas y compilación del .exe, actualizar producción.	El final no terminaba al vencer a Elenora (B-012); el panel de depuración se abría con L3 + R3 (B-013).

3.2 Project Chart

El Project Chart resume el estado de los 26 features del Feature Log. Se calcula automáticamente con la columna Estado.

Tabla 6. Estado general del proyecto.

Estado	Features	Porcentaje
Terminado	22	85%
En desarrollo	3	12%
Planeado	1	4%
Sin planear	0	0%

Project Chart - Sprint 2 (26 features)

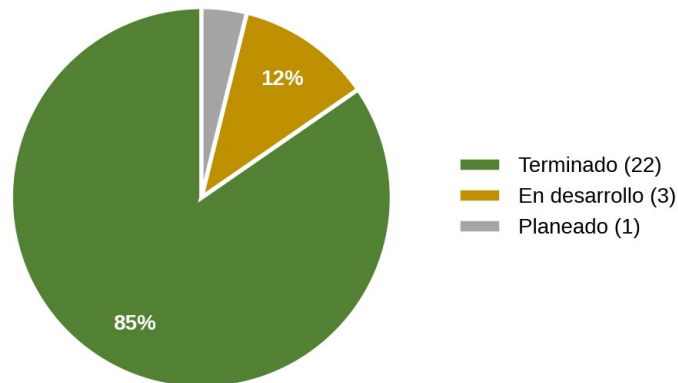


Figura 1. Project Chart del Sprint 2.

3.3 Burn-down Chart

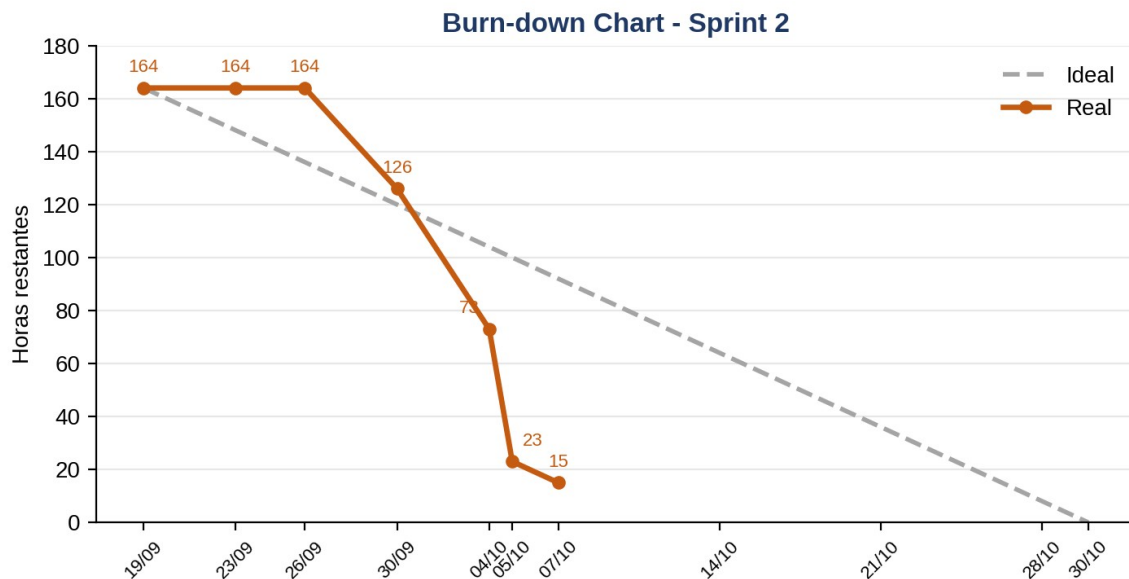


Figura 2. Burn-down Chart del Sprint 2 en horas restantes.

La línea punteada es el avance ideal, repartido de forma pareja en los 42 días del sprint. La línea real se queda plana las primeras dos semanas, que dediqué a ordenar el arte y a aprender a estructurar el proyecto en Unity, y después cae muy rápido entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, cuando la herramienta de editor y la herencia de clases permitieron armar los cinco niveles. La gráfica muestra que el trabajo se concentró en pocos días; para el Sprint 3 me propongo repartirlo mejor.

3.4 Task Chart

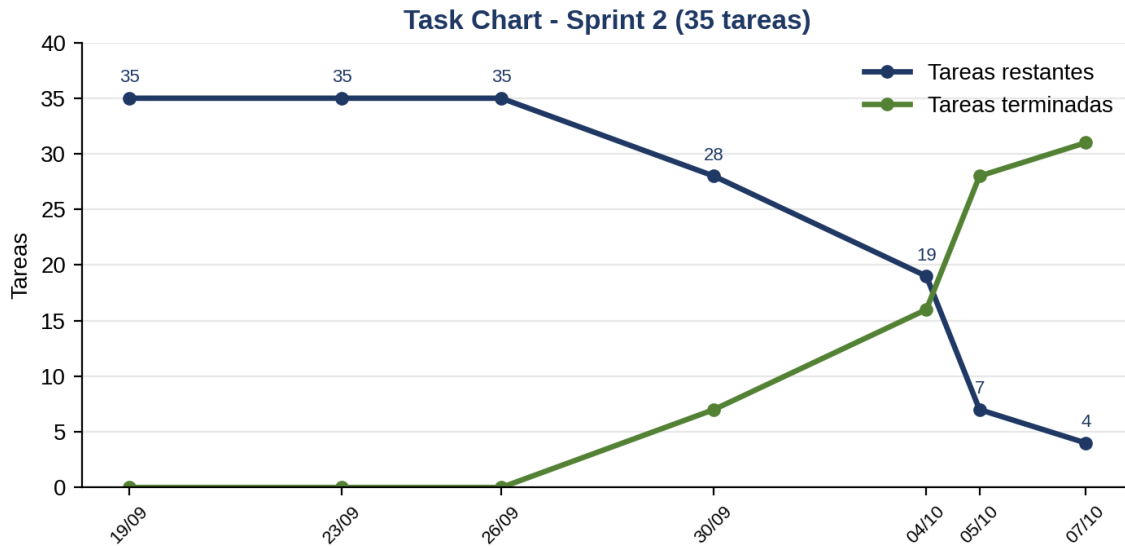


Figura 3. Task Chart del Sprint 2: tareas restantes y terminadas.

El Task Chart cuenta tareas en lugar de horas. Al 7 de octubre quedan 4 de 35 tareas, todas relacionadas con pruebas y documentación.

4. Desarrollo del juego en Unity

El juego se desarrolló en **Unity 6 (6000.6.0f1)** con la plantilla 2D (URP), luces 2D, el **New Input System** y C#. El código está en el repositorio de GitHub del proyecto, en la carpeta Código.

4.1 Verbos principales del jugador

Los verbos son las acciones que el jugador realiza todo el tiempo. Todo el diseño de niveles y enemigos gira alrededor de ellos:

Tabla 7. Verbos principales del jugador y su implementación.

Verbo	Teclado	Control PS4	Implementación
Moverse	A / D o flechas	Stick izquierdo	PlayerController: aceleración, frenado y cámara que mira hacia adelante.
Saltar y planear	Espacio / W	X (mantener para planear)	Coyote time, búfer de salto; con Viento la gravedad baja y cae lento.
Agacharse	S	Stick abajo	Cápsula más baja para pasadizos; los hechizos salen a ras de suelo.
Lanzar y apuntar	1, 2, 3 / J o clic	Cuadrado, R1, L1 + stick derecho	SpellCaster: maná, recarga y dirección en 360°.
Combinar	Dos hechizos seguidos o C	Dos hechizos seguidos o L2	Cuatro combos elementales (Explosión Arcana, Vapor Cegador, etc.).
Esquivar	Shift / K	Círculo	Impulso corto con invulnerabilidad.

Verbo	Teclado	Control PS4	Implementación
Explorar e interactuar	E	Triángulo	Diálogos, cofres, Piedras de Reaparición, salas secretas y Páginas Perdidas.

4.2 Arquitectura del código y Programación Orientada a Objetos

El proyecto tiene 69 scripts de C# (cerca de 9,600 líneas) organizados por responsabilidad:

Tabla 8. Organización de los scripts del proyecto.

Carpeta	Scripts principales
Data	Elemento, SpellData, ItemData, EnemyData (ScriptableObjects)
Player	PlayerController, SpellCaster, SpellProjectile, PlayerUpgrades, ModoArchimaga
Enemigos	EnemyBase, EnemyAI, EcoMenorAI, FlyingEnemyAI, RangedEnemyAI, MirrorEnemyAI, ColosoAI, GargolaAI, ArmaEnemigo, BossController y los cuatro jefes
Managers	GameManager, AchievementManager, Health, Pickup, Checkpoint, Cofre, CameraFollow, LevelExit
UI	UIManager, HUD, MainMenu, OpcionesUI, GrimorioUI, NPCDialogue, Prologo, CreditsScreen
Efectos	Rompible, Empujable, PlacaPresion, PuertaRunica, GeiserFuego, Carambano, CorrienteViento, Parallax, partículas
Audio / Sistema	AudioManager, Controles, VibracionControl, CapturaPantalla
Editor	CrearJuego, EditorHelpers, ConfigureSprites, Herramientas

Los pilares de la POO se aplican de la siguiente forma:

- **Herencia:** EnemyBase es una clase abstracta con la vida, el daño por contacto, el aturdimiento y la congelación. Cada enemigo solo programa su comportamiento en el método Think(). BossController agrega fases por porcentaje de vida y cada jefe define sus ataques.
- **Polimorfismo:** los hechizos y los efectos tratan a todos los enemigos como EnemyBase (aturdir, ralentizar, empujar o congelar) sin saber de qué tipo son.
- **Abstracción:** la interfaz IDamageable permite que cualquier objeto reciba daño; la implementa Health, que usan Lira, los enemigos y los objetos rompibles.
- **Encapsulamiento:** los campos son privados con [SerializeField] y se exponen con propiedades de solo lectura.
- **Eventos:** UnityEvent para la vida y el maná del HUD, y Action para hechizos desbloqueados, jefes derrotados, logros y el Modo Archimaga. Así el AchievementManager y el AudioManager reaccionan sin depender de cada sistema.

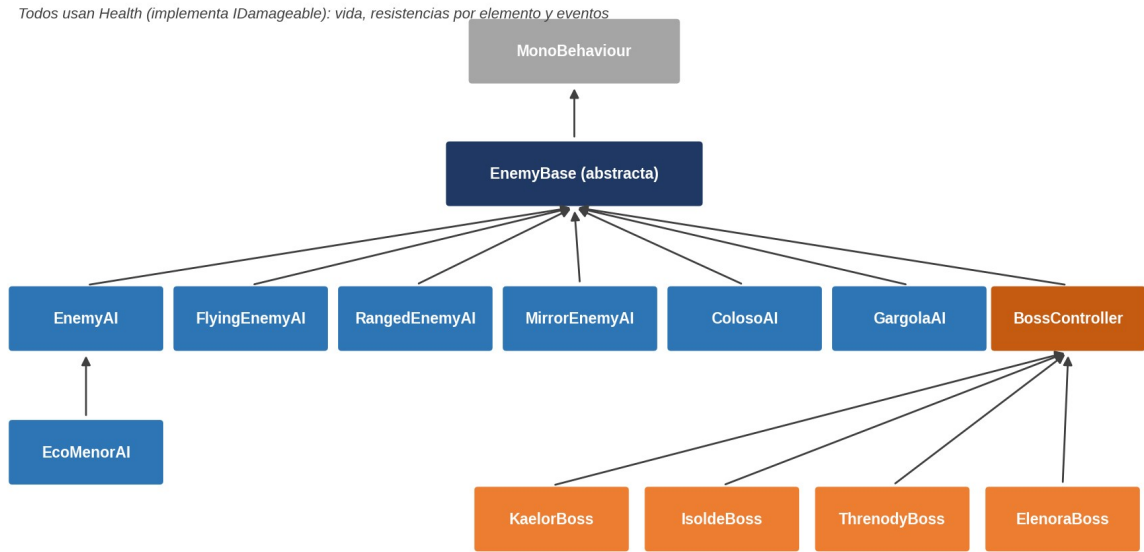


Figura 4. Jerarquía de clases de enemigos y jefes.

4.3 Escenas y niveles

Tabla 9. Escenas del juego.

Escena	Contenido
MenuPrincipal	Nueva Partida, Continuar, Opciones, Controles, Logros, Créditos y Salir
Prologo	Historia inicial con imágenes
Nivel 1: Ala de Aprendizaje	Maestra Sable, Espectros de tinta, Motas Corruptas y Espectro Mayor. Desbloquea Fuego
Nivel 2: Ala de Fuego	Centinelas de Ceniza, Salamandras de Forja, géiseres y Kaelor. Desbloquea Hielo
Nivel 3: Ala de Hielo	Espectros Escarchados, Cristales Vivientes, Gárgola de Runa, carámbanos e Isolde. Desbloquea Viento
Nivel 4: Ala de Viento	Aves de Tormenta, Golems, Coloso de Raíz, corrientes de aire, plataformas móviles y Threnody
Nivel 5: Corazón del Grimorio	Ecos Menores, Guardián Espejo, espíritus de los guardianes y el Eco de la Archimaga Elenora
Epílogo y Credits	Final de la historia y créditos



Figura 5. Ala de Aprendizaje: inicio del nivel.

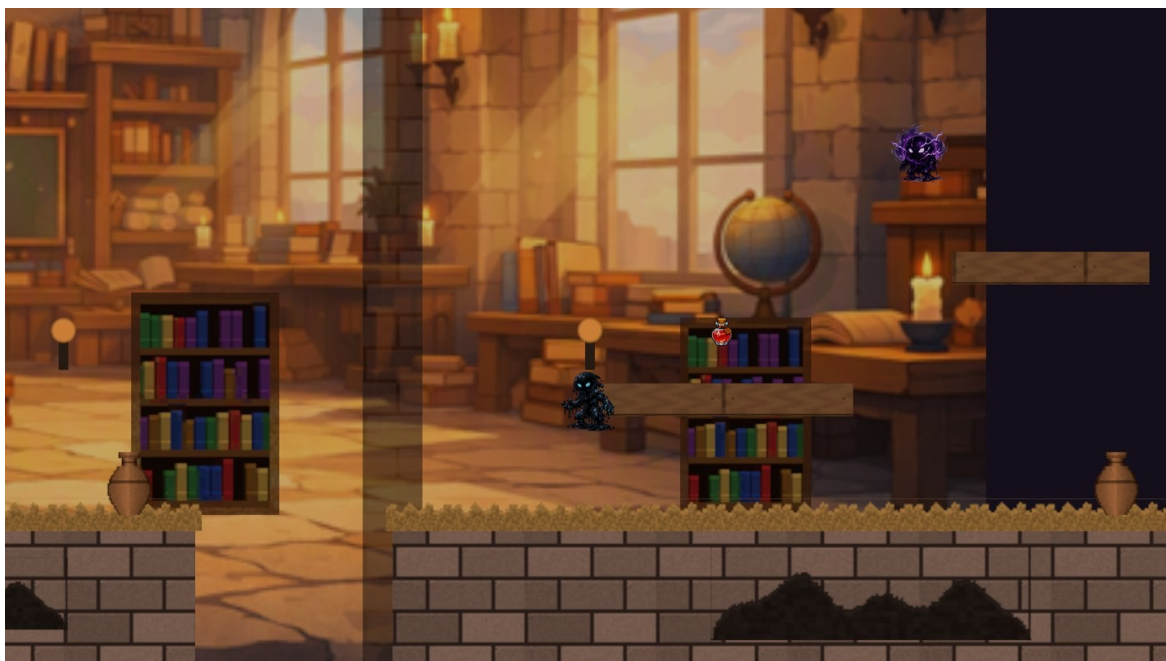


Figura 6. Ala de Aprendizaje: zona de enemigos.



Figura 7. Ala de Fuego: inicio del nivel.

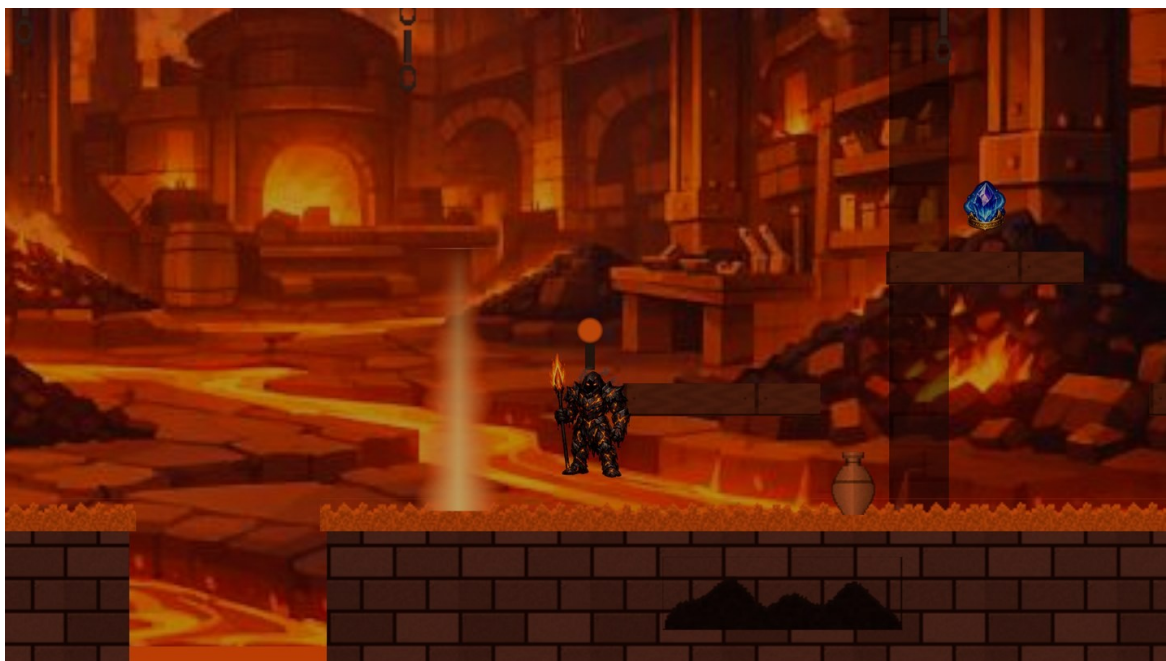


Figura 8. Ala de Fuego: zona de enemigos.



Figura 9. Ala de Hielo: inicio del nivel.

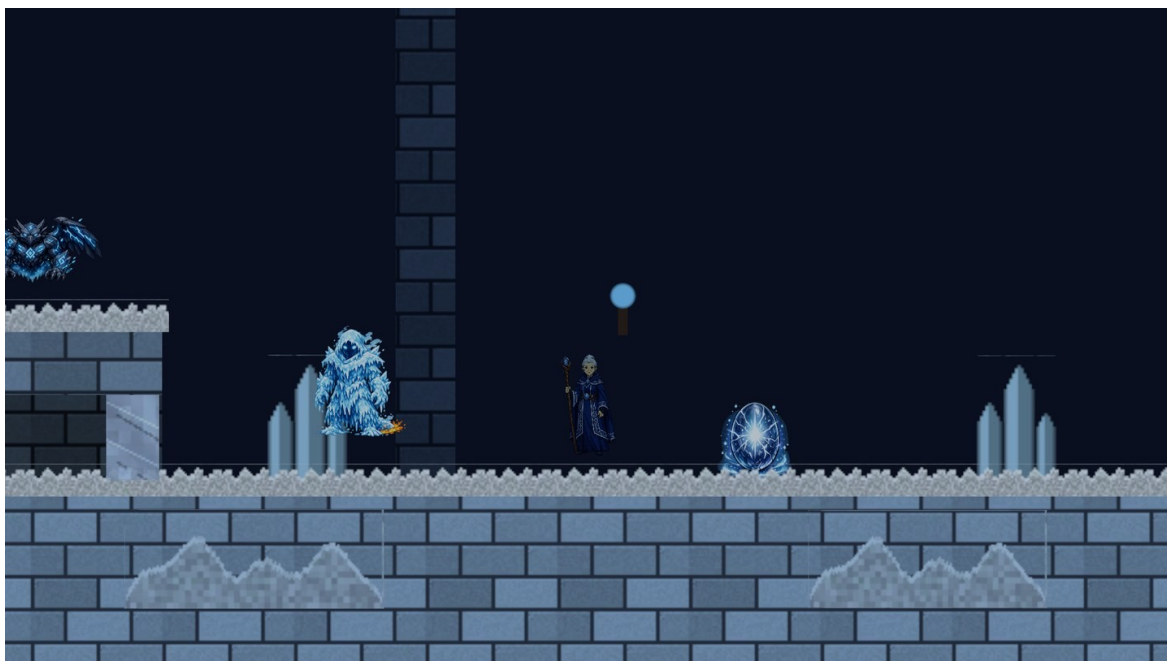


Figura 10. Ala de Hielo: personaje del nivel.



Figura 11. *Ala de Viento: inicio del nivel.*



Figura 12. *Ala de Viento: zona de enemigos.*



Figura 13. Corazón del Grimorio: inicio del nivel.



Figura 14. Corazón del Grimorio: zona de enemigos.

4.4 Interfaces implementadas

Tabla 10. Interfaces del juego (secciones 2.5 y 2.6 del Documento de Diseño).

Pantalla	Descripción
Menú principal	Nueva Partida, Continuar (guardado en PlayerPrefs), Opciones, Controles, Logros, Créditos y Salir.

Pantalla	Descripción
HUD	Retrato de Lira, vida, maná, hechizos equipados con su botón, combo disponible, fragmentos y páginas del ala.
Pausa	Reanudar, Grimorio, Opciones, Controles, Logros y Menú principal.
Opciones	Volumen de música, efectos y voces, pantalla completa y vibración del control.
Grimorio	Hechizos, combos, mejoras, esquivas y armas de los enemigos.
Resultados	Al terminar cada ala: tiempo, enemigos, daño recibido, Páginas Perdidas, salas secretas, fragmentos y hechizo nuevo.
Game Over	Reintentar desde la última Piedra de Reparación o volver al menú.
Diálogos	Retrato y nombre de quien habla, texto que aparece letra por letra y voz.

La interfaz usa la fuente **Poppins Bold**, elegida por ser más clara a distancia, con DejaVu Sans Bold de respaldo para mostrar el símbolo del botón Cuadrado del control.

4.5 Habilidades elementales y acertijos

Cada hechizo que Lira aprende abre rutas que antes estaban bloqueadas, como pide la sección 2.11 del Documento de Diseño:

Tabla 11. Habilidades elementales y acertijos ambientales.

Elemento	Habilidad en combate	Uso en la exploración
Arcano	Proyectil base	Rompe muros agrietados y vasijas
Fuego	Daño alto	Quema zarzas de tinta y derrite muros de hielo (Ala de Fuego, Ala de Hielo y Corazón)
Hielo	Ralentiza; al tercer golpe seguido congela al enemigo	Congela enemigos para usarlos de paso
Viento	Empuja enemigos	Empuja la caja hasta la placa de presión que abre la puerta rúnica; permite planear



Figura 15. Arte de los cuatro hechizos elementales.

4.6 Audio

El juego tiene 9 pistas de música (menú, una por ala, jefe, jefe final y créditos), 29 efectos de sonido y voces cortas para cada personaje que suenan mientras aparece el texto del diálogo. El AudioManager cambia la música con transición suave al cargar cada escena y al aparecer un jefe, y al derrotar a un guardián suena un efecto especial (sección 2.17,

S4). La música y los efectos los generé con scripts de Python (NumPy y SciPy) y los convertí a OGG con FFmpeg; los scripts están en Código/Herramientas/Audio.

4.7 Herramientas de editor

Para no armar a mano cada escena, programé herramientas que aparecen en el menú **Ecos del Grimoio** de Unity:

- **Crear juego completo:** genera los prefabs y las nueve escenas (menú, prólogo, cinco niveles, epílogo y créditos) y las agrega a Build Settings.
- **Configurar sprites:** ajusta los ajustes de importación de todas las imágenes.
- **Capturar niveles para evidencias:** abre cada nivel y guarda imágenes del inicio, los enemigos y el guardián.
- **Compilar juego (.exe):** genera el ejecutable para Windows en la carpeta Build del proyecto.

5. Pruebas Alfa

Las pruebas Alfa las hice yo mismo al terminar cada versión, jugando con teclado y con un control de PS4 conectado por Bluetooth. Los casos 1 a 3 vienen de la sección 4.3 del Documento de Diseño; el resto se agregó durante el sprint.

5.1 Casos de prueba

Tabla 12. Casos de prueba Alfa del Sprint 2.

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PA-01	Costo de maná y recarga de cada hechizo	No se lanza sin maná suficiente ni antes de que termine la recarga.	Se respeta el costo y la recarga.	Aprobada
PA-02	Los hechizos solo dañan lo que tiene IDamageable	Solo los enemigos y objetos rompibles reciben daño.	Correcto.	Aprobada
PA-03	IA cambia entre patrulla y persecución	Patrulla lejos de Lira y la persigue dentro de su rango.	Correcto.	Aprobada
PA-04	Control de PS4 por Bluetooth	Todas las acciones responden y el control vibra al recibir daño.	Correcto.	Aprobada
PA-05	Música y efectos al iniciar	Se escucha la música del menú y los sonidos de los botones.	Sin sonido (B-003). Corregido.	Aprobada
PA-06	Cambio de nivel con pantalla de resultados	Aparece la pantalla de resultados y luego carga el Nivel 2.	Se quedaba atorado (B-011). Corregido.	Aprobada
PA-07	Modo Archimaga	Aparece el aviso y Lira no gasta maná ni recibe daño.	Fallaba a veces (B-008). Corregido.	Aprobada
PA-08	Pantalla de Opciones	Los cambios se aplican y se guardan.	Funciona en el editor.	Aprobada
PA-09	Fuego quema las zarzas	Solo el Fuego las quema y se abre el pasadizo.		Pendiente
PA-10	Hielo congela al tercer golpe	El enemigo se pinta de azul y no se mueve por 2.5 s.		Pendiente

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PA-11	Viento: planear y empujar la caja	Lira cae lento; la caja abre la puerta rúnica.		Pendiente
PA-12	Final del juego	¡VICTORIA!, epílogo y créditos; al final regresa al menú.	No terminaba (B-012). Corregido, falta probar.	Pendiente
PA-13	Páginas Perdidas y salas secretas	Cada página da +5 de vida máxima; el muro revela la sala.		Pendiente
PA-14	Build .exe	El juego abre en pantalla completa y se puede jugar de inicio a fin.		Pendiente

Los casos marcados como pendientes se van a probar antes del cierre del sprint con el ejecutable.

5.2 Buglist

Tabla 13. Buglist del Sprint 2 (autor: Alejandro Pérez Alcántara).

BugID	Descripción	Descripción técnica	Estado	Feature
B-001	El escenario se veía plano y las barras del HUD no mostraban su imagen.	Los sprites de la UI no estaban asignados en el prefab del HUD y los fondos no tenían capas.	Corregido	15
B-002	Faltaban imágenes de la interfaz y las columnas del fondo.	Nombres de archivo distintos entre la carpeta Sprites y las rutas de CrearJuego.cs.	Corregido	14
B-003	No se escuchaba la música ni los efectos.	Ninguna cámara tenía AudioListener. El AudioManager ahora agrega el suyo y quita los de las cámaras.	Corregido	19
B-004	Los textos de Controles y Logros se salían del marco.	El marco ornamentado se estiraba como imagen simple; se cambió por un panel 9-slice (PanelUI).	Corregido	15
B-005	El retrato de Lira en el HUD se veía mal dentro del marco.	El sprite completo se mostraba encima del marco; se agregó una máscara circular.	Corregido	17
B-006	Al vencer a Elenora se repetía la batalla final y no salían los créditos.	"Continuar" guardaba el Nivel 5 y no había transición al epílogo; se agregó FinishGame().	Corregido	11
B-007	Los créditos tardaban unos 15 segundos en aparecer.	El texto empezaba en y = -900, fuera de la pantalla; ahora empieza visible.	Corregido	18
B-008	El Modo Archimaga a veces no se activaba.	Cualquier otra tecla reiniciaba la secuencia; ahora solo cuentan las teclas del código.	Corregido	13
B-009	Las voces de los personajes sonaban raras y fuertes.	Síntesis con demasiada aspereza; se suavizó y se bajó el volumen.	Corregido	19
B-010	No se veían las armas de los enemigos.	Los prefabs no tenían el sprite del arma; se creó ArmaEnemigo.cs.	Corregido	22
B-011	El juego se quedaba atorado en el portal del Nivel 1 sin mostrar resultados.	Un error en un evento de LevelCompleted cortaba CompleteLevel antes de ShowResults; se protegió con try/catch y Enter/X continúa.	Corregido	17
B-012	Al vencer a Elenora no terminaba el juego.	La secuencia final dependía de que todos los eventos terminaran sin error; ahora hay un respaldo que termina el juego siempre.	Por verificar	11
B-013	Se abría un panel de estadísticas de Unity al apretar los dos sticks.	Rendering Debugger de URP activo en tiempo de juego (L3 + R3); se desactiva en CapturaPantalla.cs.	Corregido	20

Varios errores solo aparecieron al jugar con el control y en partidas completas, como el juego sin sonido (B-003), el cambio de nivel atorado (B-011) y el final que no terminaba (B-012). Por eso, en el Sprint 3 las pruebas se harán con el ejecutable y de principio a fin.

6. Sprint Review

Tabla 14. *Sprint Review del Sprint 2 (avance al 7 de octubre de 2026).*

Meta del sprint	Juego completo jugable en Unity con las cinco alas, jefes, logros y Modo Archimaga, listo para pruebas Alfa.
Tareas terminadas	31 de 35
Horas terminadas	149 de 164 hrs
Features terminados	22 de 26
Bugs corregidos	12 de 13
Pruebas Alfa aprobadas	8 de 14
Demostración	Partida desde el menú hasta el Ala de Fuego con el control de PS4: diálogo con la Maestra Sable, combate, sala secreta, pantalla de resultados y Opciones.
¿Qué salió bien?	La herramienta de editor permite reconstruir todas las escenas en un clic. El código con herencia (EnemyBase, BossController) hizo rápido agregar enemigos y jefes. Se adelantaron los features de los Sprints 3 y 4.
¿Qué salió mal?	Varias fallas solo aparecieron al jugar con el control (sonido, textos fuera del marco, final del juego). El Burn-down muestra que la mayor parte del trabajo se concentró en pocos días.
Ajustes para el Sprint 3	Sesiones más cortas y repartidas. Probar cada ala completa antes de agregar contenido nuevo. Pruebas Beta con compañeros usando el .exe.
Fecha de cierre	30 de octubre de 2026 (entrega del Producto 2)

7. Presupuesto y licencia

7.1 Presupuesto

El proyecto es académico y no tiene presupuesto monetario (sección 2.20 del Documento de Diseño). Todas las herramientas de desarrollo tienen licencia gratuita:

Tabla 15. *Recursos utilizados y su costo.*

Recurso	Uso	Costo
Unity 6 Personal	Motor del juego	Gratis
Visual Studio Code y .NET SDK	Edición y compilación del código C#	Gratis
Git y GitHub	Control de versiones y repositorio	Gratis
GIMP	Limpieza y recorte del arte	Gratis
Python, NumPy, SciPy y FFmpeg	Generación de música, efectos y voces	Gratis
Fuentes Poppins y DejaVu Sans	Texto de la interfaz	Gratis (licencias libres)
Computadora personal y control de PS4	Desarrollo y pruebas	Equipo propio

El recurso principal es el tiempo: el Sprint 2 suma 164 horas estimadas en el Sprint Backlog.

7.2 Licencia y propiedad intelectual

- "Ecos del Grimorio" es un proyecto original: la historia, los personajes, los niveles, el código y el audio son de mi autoría y no usan personajes, nombres ni guiones de otras obras.
- El arte digital se generó con Copilot Pro a partir de mis bocetos y descripciones, y se limpió en GIMP (sección 2.17b del Documento de Diseño).
- Las fuentes Poppins y DejaVu Sans se distribuyen bajo licencias libres que permiten incluirlas en el juego; los textos de licencia están en Assets/Fonts.
- Unity Personal permite publicar el juego sin pagar regalías mientras se cumplan sus términos.
- Si el juego se publicara, se podría registrar la obra ante INDAUTOR y solicitar una clasificación por edades (sección 5.2 del Documento de Diseño).

8. Plan para el Sprint 3

El Sprint 3 va del 31 de octubre al 20 de noviembre de 2026 y corresponde al Producto 3. Sus actividades principales son:

- **Pruebas Beta cerradas:** compañeros del grupo juegan el ejecutable y llenan un formato con lo que les gustó, lo que no entendieron y los errores que encontraron.
- **Pruebas Beta abiertas:** compartir el ejecutable con más personas para revisar la dificultad y el tiempo de cada ala.
- **Corrección y balance:** atender el Buglist de las pruebas Beta y ajustar la dificultad.
- **Postmortem:** reporte con lo que salió bien, lo que salió mal, los obstáculos, los efectos positivos y negativos y la conclusión, siguiendo la plantilla de Huddle.
- **Gold Master (Sprint 4):** versión final del ejecutable y entrega el 30 de noviembre de 2026.

Conclusión

En el Sprint 2 el proyecto pasó del papel a un juego completo en Unity. El mayor acierto fue invertir al principio en una base de código bien organizada y en herramientas de editor; eso permitió adelantar features de los Sprints 3 y 4 y dejar tiempo para pruebas. Lo que más me costó fue detectar errores que solo aparecen al jugar de principio a fin, y la gráfica de Burn-down muestra que el trabajo se concentró en pocos días.

Seguir el proceso Huddle me ayudó a no perder de vista el Documento de Diseño: la matriz de coherencia mostró qué secciones no tenían tarea y con eso se agregaron las

Opciones, las habilidades elementales y los acertijos. Para el siguiente sprint el reto es que otras personas jueguen y confirmar que el juego se entiende sin que yo lo explique.

Referencias

Keith, C. (2010). Agile game development with Scrum. Addison-Wesley.

Morales Urrutia, G. A., Nava López, C. E., Fernández Martínez, L. F., & Rey Corral, M. A. (2010). Procesos de desarrollo de software para videojuegos. Revista de Sistemas e Informática, 7(1), 45-62.

Schell, J. (2019). The art of game design: A book of lenses (3rd ed.). CRC Press.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide. <https://www.scrum.org/>

Swink, S. (2009). Game feel: A game programmer's guide to virtual sensation. CRC Press.

Unity Technologies. (2026). Unity 6 Manual y Scripting API. <https://docs.unity.com/>

Unity Technologies. (2026). Input System.
<https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@latest>

Microsoft. (2026). Documentación de C#. <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/>
